

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Piano di Progetto

Pianificazione, Rischi e Preventivo

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: v1.11.0

Data: 2026-05-20

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.11.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornato PaF.
1.10.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornata lista rischi con aggiunta RR5, RT5, RO6.
1.9.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiunto Diagramma di Gantt aggiornato alla data corrente.
1.8.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento sezione Pianificazione.
1.7.0	2026-05-20	Sofia De Blasi	Roberto M. Doroftei	Stesura Sprint 6 e aggiornato organigramma.
1.6.2	2026-05-17	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Modificata tabella registro modifiche.
1.6.1	2026-05-17	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Inserimento Sprint 5 in Organigramma e aggiornamento consuntivi orari ed economici.
1.6.0	2026-05-16	Armando M. Scarati	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 5.
1.5.0	2026-05-11	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Inserimento Sprint 4 in Organigramma.
1.4.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornamento Modello di sviluppo.
1.3.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Stesura sezione Sprint 4.
1.2.1	2026-05-2	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Rimossa una sezione ridondante nella definition of done.
1.2.0	2026-05-1	Francesco Marcon	Sofia De Blasi	Stesura sezione Sprint 3.
1.1.1	2026-04-27	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Correzione errori.
1.1.0	2026-04-23	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Stesura sezione Sprint 2.
1.0.0	2026-04-23	Responsabile: Francesco Marcon		Approvazione ingresso in baseline RTB.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.6.1	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione refuso.
0.6.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Inserimento sottosezioni di gestione rischi in sezione Sprint 1.
0.5.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura sezione Sprint 1.
0.4.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Preventivo, Sprint, Preventivo a Finire e Organigramma.
0.3.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Inserimento sezione Definition of Done.
0.2.0	2026-04-19	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Modello di Sviluppo.
0.1.0	2026-04-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento struttura Introduzione e Analisi dei Rischi.
0.0.0	2026-04-09	Anton R. Rupi	Filippo Idiometri	Creazione struttura documento.

Indice

1	Introduzione	9
1.1	Scopo del documento	9
1.2	Scopo del prodotto	9
1.3	Glossario	9
1.4	Riferimenti	9
1.4.1	Normativi	9
1.4.2	Informativi	10
1.5	Scadenze	10
2	Analisi dei Rischi	11
2.1	Nomenclatura e lettura della tabella	11
2.2	RR - Rischi Legati ai Requisiti	11
2.3	RT -Rischi Tecnici	13
2.4	RO - Rischi Organizzativi	14
2.5	Matrice dei rischi	15
2.6	Monitoraggio dei rischi	16
3	Modello di Sviluppo	17
3.1	Scelta del modello	17
3.2	Motivazioni	17
3.3	Cerimonie e cadenza settimanale	17
3.4	Risorse Umane	18
4	Definition of Done (DoD)	19
4.1	Livello task: Fase documentale	19
4.2	Livello task: Fase sviluppo (PoC)	20
4.3	Livello sprint	20
5	Pianificazione	21
5.1	Suddivisione temporale	21
5.2	Pianificazione a lungo termine	21
5.2.1	Attività di candidatura (CC)	21
5.2.2	Attività preparatorie alla RTB	21
5.2.3	Attività fissate per la RTB	21
5.2.3.1	Norme di Progetto (NdP)	21
5.2.3.2	Glossario	22
5.2.3.3	Piano di Progetto (PdP)	22

5.2.3.4	Analisi dei Requisiti (AdR)	22
5.2.3.5	Piano di Qualifica (PdQ)	22
5.2.3.6	Stato dell'Arte – Analisi Tecnologica	22
5.2.3.7	Proof of Concept (PoC)	22
5.2.4	Diagramma di Gantt	22
6	Preventivo	24
6.1	Assunzioni sul costo orario per ruolo	24
6.2	Preventivo iniziale	24
6.3	Ore di ciascun componente per ruolo preventivate	24
7	Sprint	25
7.1	Sprint 1 – 07/04/2026 – 13/04/2026	25
7.1.1	Ruoli assegnati	25
7.1.2	Obiettivi	25
7.1.3	Preventivo	25
7.1.4	Rischi Previsti	25
7.1.5	Consuntivo	26
7.1.6	Prospetto risorse residue per ruolo	26
7.1.7	Prospetto ore residue per membro	26
7.1.8	Sprint Retrospective	27
7.1.9	Aggiornamento dei rischi	27
7.1.10	Sprint Review	27
7.2	Sprint 2 – 14/04/2026 – 21/04/2026	27
7.2.1	Ruoli assegnati	27
7.2.2	Obiettivi	28
7.2.3	Preventivo	28
7.2.4	Rischi Previsti	28
7.2.5	Consuntivo	28
7.2.6	Prospetto risorse residue per ruolo	29
7.2.7	Prospetto ore residue per membro	29
7.2.8	Sprint Retrospective	29
7.2.9	Aggiornamento dei rischi	30
7.2.10	Sprint Review	30
7.3	Sprint 3 – 21/04/2026 – 27/04/2026	30
7.3.1	Ruoli assegnati	30
7.3.2	Obiettivi	30
7.3.3	Preventivo	31

7.3.4	Rischi Previsti	31
7.3.5	Consuntivo	31
7.3.6	Prospetto risorse residue per ruolo	32
7.3.7	Prospetto ore residue per membro	32
7.3.8	Sprint Retrospective	32
7.3.9	Aggiornamento dei rischi	33
7.3.10	Sprint Review	33
7.4	Sprint 4 – 28/04/2026 – 04/05/2026	33
7.4.1	Ruoli assegnati	33
7.4.2	Obiettivi	33
7.4.3	Preventivo	34
7.4.4	Rischi Previsti	34
7.4.5	Consuntivo	34
7.4.6	Prospetto risorse residue per ruolo	35
7.4.7	Prospetto ore residue per membro	35
7.4.8	Sprint Retrospective	35
7.4.9	Aggiornamento dei rischi	35
7.4.10	Sprint Review	35
7.5	Sprint 5 – 05/05/2026 – 11/05/2026	36
7.5.1	Ruoli assegnati	36
7.5.2	Obiettivi	36
7.5.3	Preventivo	36
7.5.4	Rischi Previsti	36
7.5.5	Consuntivo	37
7.5.6	Prospetto risorse residue per ruolo	37
7.5.7	Prospetto ore residue per membro	37
7.5.8	Sprint Retrospective	38
7.5.9	Aggiornamento dei rischi	38
7.5.10	Sprint Review	38
7.6	Sprint 6 – 12/05/2026 – 18/05/2026	38
7.6.1	Ruoli assegnati	38
7.6.2	Obiettivi	39
7.6.3	Preventivo	39
7.6.4	Rischi Previsti	39
7.6.5	Consuntivo	40
7.6.6	Prospetto risorse residue per ruolo	40
7.6.7	Prospetto ore residue per membro	41

7.6.8	Sprint Retrospective	41
7.6.9	Aggiornamento dei rischi	41
7.6.10	Sprint Review	41
8	Preventivo a Finire (PaF)	43
8.1	Analisi scostamenti	43
8.2	Ripianificazione	43
8.3	Quadro economico aggiornato	43
9	Organigramma e Assegnazione Ruoli	44
9.1	Rotazione dei Ruoli	44
9.2	Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)	45

Elenco delle tabelle

2	Scheda rischio RR1	11
3	Scheda rischio RR2	12
4	Scheda rischio RR3	12
5	Scheda rischio RR4	12
6	Scheda rischio RR5	12
7	Scheda rischio RT1	13
8	Scheda rischio RT2	13
9	Scheda rischio RT3	13
10	Scheda rischio RT4	13
11	Scheda rischio RT5	14
12	Scheda rischio RO1	14
13	Scheda rischio RO2	14
14	Scheda rischio RO3	14
15	Scheda rischio RO4	15
16	Scheda rischio RO5	15
17	Scheda rischio RO6	15
18	Matrice qualitativa dei rischi	15
19	Schema cerimonie settimanali	18
20	Tabella Preventivo Sprint 1	25
21	Tabella Consuntivo Sprint 1	26
22	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 1	26
23	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 1	26
24	Tabella Preventivo Sprint 2	28
25	Tabella Consuntivo Sprint 2	28
26	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 2	29
27	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 2	29
28	Tabella Preventivo Sprint 3	31
29	Tabella Consuntivo Sprint 3	31
30	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 3	32
31	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 3	32
32	Tabella Preventivo Sprint 4	34
33	Tabella Consuntivo Sprint 4	34
34	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 4	35
35	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 4	35
36	Tabella Preventivo Sprint 5	36

37	Tabella Consuntivo Sprint 5	37
38	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 5	37
39	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 5	37
40	Tabella Preventivo Sprint 6	39
41	Tabella Consuntivo Sprint 6	40
42	Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 6	40
43	Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 6	41
44	Tabella Rotazione dei Ruoli	44
45	Tabella Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)	46

1 Introduzione

Il presente documento costituisce il Piano di Progetto (PdP) del gruppo Synergo Unit relativo allo sviluppo del sistema Second Brain, proposto da Zucchetti S.p.A. nell'ambito del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026. Esso definisce l'organizzazione del lavoro, i rischi identificati, le risorse disponibili, la suddivisione delle attività e il calendario delle stesse, in conformità con le pratiche di ingegneria del software.

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto ha i seguenti obbiettivi:

- definire la struttura organizzativa e i ruoli del team;
- identificare e gestire i rischi in modo proattivo con piano di mitigazione e contingenza;
- fornire una visione chiara e aggiornata dell'andamento del progetto;
- pianificare le attività nel breve e nel lungo termine con milestone;
- stimare i costi, rendicontare le ore effettive e aggiornare il preventivo a finire.

1.2 Scopo del prodotto

Zucchetti S.p.A. propone la realizzazione di una piattaforma web orientata alla scrittura e alla gestione avanzata di contenuti testuali, concepita come un ambiente intelligente di supporto all'utente. Il sistema si baserà su Markdown per la formattazione dei documenti e integrerà modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per ampliare le funzionalità disponibili.

All'interno dell'applicazione, l'utente potrà redigere testi con aggiornamento immediato della visualizzazione, oltre a sfruttare strumenti automatizzati per la produzione e l'elaborazione dei contenuti, come generazione, sintesi, riformulazione e traduzione. Sarà inoltre possibile adottare approcci strutturati all'analisi, tra cui la tecnica dei "Sei cappelli per pensare", utile per valutare un testo da molteplici prospettive. Un'ulteriore caratteristica consisterà nell'utilizzo di istruzioni testuali per guidare la creazione di nuovi contenuti, secondo il paradigma del cosiddetto Distant Writing.

Nel complesso, la soluzione mira a fornire un ambiente evoluto per la scrittura creativa e l'organizzazione delle idee, sfruttando le capacità degli LLM per migliorare il processo di produzione e revisione dei testi.

1.3 Glossario

I termini tecnici o ambigui utilizzati in questo documento sono marcati con il pedice alla prima occorrenza nel testo e sono definiti nel documento [Glossario](#).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato d'appalto C6: [Zucchetti S.p.A.](#)
- [Regolamento del Progetto Didattico](#), Prof. Tullio Vardanega, A.A. 2025/2026.

- Norme di Progetto

1.4.2 Informativi

- Analisi dei Requisiti
- Verbali degli incontri interni ed esterni
- Slide del corso di Ingegneria del Software (T04 - Gestione di progetto)

1.5 Scadenze

I termini concordati per le revisioni di progetto sono i seguenti:

- **RTB (Requirements and Technology Baseline):** Marzo-Giugno
- **PB (Product Baseline):** Giugno-Agosto

2 Analisi dei Rischi

2.1 Nomenclatura e lettura della tabella

Ogni rischio è identificato da un codice composto da due lettere indicanti la categoria e un numero progressivo:

- **RR:** Rischi legati ai Requisiti (ambiguità, scope creep, qualità, scadenze)
- **RT:** Rischi Tecnici (tecnologie, integrazione, strumenti, debito tecnico)
- **RO:** Rischi Organizzativi (disponibilità, comunicazione, carico, motivazione, comprensione)

Per ciascun rischio vengono indicati:

- **Codice:** Identificativo univoco del rischio (es. RR1, RT2, RO5).
- **Descrizione:** Descrizione sintetica del rischio.
- **Probabilità di occorrenza:** Valutazione della probabilità che il rischio si manifesti (Alta / Media / Bassa).
- **Impatto:** Valutazione dell'impatto che il rischio avrebbe sul progetto (Alta / Media / Bassa).
- **Piano di mitigazione:** Azioni preventive volte a ridurre la probabilità o l'impatto del rischio.
- **Piano di contingenza:** Azioni da intraprendere nel caso in cui il rischio si verifichi.

2.2 RR - Rischi Legati ai Requisiti

Codice	RR1
Descrizione	Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Versionare i requisiti nel VCS; approvare formalmente le baseline; mantenere confronto continuo con il proponente
Piano di Contingenza	Attivazione del processo di change request; revisione backlog; ri-negoziazione delle priorità e della pianificazione

Tabella 2: Scheda rischio RR1

Codice	RR2
Descrizione	Scope creep: aggiunta incontrollata di funzionalità
Probabilità / Impatto	Alta/Alta
Piano di Mitigazione	Definizione chiara dello scope RTB; backlog prioritizzato; approvazione preventiva delle nuove feature
Piano di Contingenza	Posticipo delle funzionalità non essenziali alla PB; riduzione dello scope MVP

Tabella 3: Scheda rischio RR2

Codice	RR3
Descrizione	Qualità insufficiente del prodotto (bug, mancanza di test)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Definition of Done con criteri di qualità espliciti; code review sistematiche; copertura minima di test definita
Piano di Contingenza	Sprint dedicato al bug fixing; riallocazione del tempo verso attività di verifica e validazione

Tabella 4: Scheda rischio RR3

Codice	RR4
Descrizione	Mancato rispetto delle scadenze (RTB o PB)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Pianificazione conservativa con buffer temporali; monitoraggio settimanale dell'avanzamento e della burndown chart
Piano di Contingenza	Riduzione dello scope MVP; rinegoziazione delle milestone interne; riallocazione delle risorse

Tabella 5: Scheda rischio RR4

Codice	RR5
Descrizione	Ritardo nella validazione dei requisiti da parte del proponente
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Organizzare incontri periodici di validazione incrementale; condividere frequentemente gli avanzamenti
Piano di Contingenza	Congelamento temporaneo dei requisiti già condivisi; prosecuzione dello sviluppo sulle funzionalità validate

Tabella 6: Scheda rischio RR5

2.3 RT -Rischi Tecnici

Codice	RT1
Descrizione	Inesperienza con le tecnologie scelte (framework, librerie, API)
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Formazione iniziale, spike tecnici e studio delle tecnologie candidate; pair programming
Piano di Contingenza	Riduzione dello scope tecnico; sostituzione di librerie o componenti troppo complessi

Tabella 7: Scheda rischio RT1

Codice	RT2
Descrizione	Problemi di integrazione tra componenti (frontend/backend, API esterne)
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Definizione preventiva delle interfacce e dei contratti API; utilizzo di mock e test di integrazione
Piano di Contingenza	Sessioni straordinarie di integrazione; revisione dell'architettura dei componenti coinvolti

Tabella 8: Scheda rischio RT2

Codice	RT3
Descrizione	Indisponibilità o instabilità di strumenti/servizi esterni (GitHub, CI/CD, cloud)
Probabilità / Impatto	Bassa/Media
Piano di Mitigazione	Predisporre strumenti alternativi e backup locali; documentare workflow indipendenti dai servizi esterni
Piano di Contingenza	Passaggio temporaneo ad ambienti locali; aggiornamento della pianificazione e sospensione delle pipeline dipendenti

Tabella 9: Scheda rischio RT3

Codice	RT4
Descrizione	Debito tecnico accumulato che rallenta gli sprint successivi
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Refactoring incrementale continuo; code review; riserva di capacità dedicata al debito tecnico
Piano di Contingenza	Sprint dedicato alla manutenzione correttiva e al consolidamento tecnico

Tabella 10: Scheda rischio RT4

Codice	RT5
Descrizione	Le tecnologie selezionate potrebbero non soddisfare pienamente i requisiti del progetto
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Analisi comparativa delle tecnologie; sviluppo del PoC; confronto continuo con il proponente
Piano di Contingenza	Sostituzione delle componenti critiche; riduzione dello scope tecnico non essenziale

Tabella 11: Scheda rischio RT5

2.4 RO - Rischi Organizzativi

Codice	RO1
Descrizione	Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Condivisione continua delle conoscenze; documentazione costante delle attività; evitare single point of failure
Piano di Contingenza	Ridistribuzione del carico; riduzione dello scope dello sprint; aggiornamento della pianificazione

Tabella 12: Scheda rischio RO1

Codice	RO2
Descrizione	Conflitti interni al team o scarsa comunicazione
Probabilità / Impatto	Bassa/Alta
Piano di Mitigazione	Daily standup regolari; retrospettive periodiche; definizione di convenzioni condivise
Piano di Contingenza	Mediazione del responsabile; eventuale coinvolgimento del docente o del proponente

Tabella 13: Scheda rischio RO2

Codice	RO3
Descrizione	Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro
Probabilità / Impatto	Media/Media
Piano di Mitigazione	Monitoraggio continuo delle ore e della velocity; revisione periodica dell'assegnazione task
Piano di Contingenza	Ribilanciamento immediato del backlog; redistribuzione delle responsabilità

Tabella 14: Scheda rischio RO3

Codice	RO4
Descrizione	Perdita di motivazione o disimpegno di uno o più membri
Probabilità / Impatto	Bassa/Media
Piano di Mitigazione	Obiettivi incrementali chiari; monitoraggio del carico di lavoro; coinvolgimento continuo del team
Piano di Contingenza	Colloqui individuali; riallocazione task; supporto organizzativo del gruppo

Tabella 15: Scheda rischio RO4

Codice	RO5
Descrizione	Scarsa comprensione dei requisiti o della visione di progetto
Probabilità / Impatto	Media/Alta
Piano di Mitigazione	Workshop iniziali di analisi; aggiornamento continuo del glossario e dei casi d'uso; confronto periodico con il proponente
Piano di Contingenza	Revisione straordinaria dei requisiti; riallineamento del backlog e delle priorità progettuali

Tabella 16: Scheda rischio RO5

Codice	RO6
Descrizione	Sottostima del carico documentale e organizzativo associato al ruolo di Amministratore
Probabilità / Impatto	Alta/Media
Piano di Mitigazione	Distribuzione delle attività redazionali; revisione periodica della pianificazione delle ore
Piano di Contingenza	Aggiornamento del Preventivo a Finire; riallocazione del budget orario tra i membri del gruppo

Tabella 17: Scheda rischio RO6

2.5 Matrice dei rischi

Probabilità \ Impatto	Bassa	Media	Alta
Alta	–	RR1, RR4, RR5, RT1, RT5, RO1, RO5	RR2
Media	RT3, RO4	RT2, RT4, RO3	RO6
Bassa	–	–	–

Tabella 18: Matrice qualitativa dei rischi

2.6 Monitoraggio dei rischi

I rischi vengono rivalutati al termine di ogni Sprint Review. Il Responsabile monitora l'evoluzione dei rischi identificati, verifica l'efficacia delle azioni di mitigazione adottate e aggiorna il registro dei rischi sulla base di eventuali nuovi elementi emersi durante lo sviluppo del progetto.

3 Modello di Sviluppo

3.1 Scelta del modello

Il gruppo adotta un modello di sviluppo agile ispirato a Scrum, con sprint settimanali da martedì a martedì e rotazione settimanale dei ruoli.

La durata settimanale degli sprint consente di suddividere le attività in task a granularità ridotta e maggiormente monitorabili, favorendo un controllo continuo dello stato di avanzamento del progetto.

La frequente pianificazione incrementale permette inoltre di individuare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti, riducendo il rischio di accumulo di ritardi o debito tecnico.

Infine, l'organizzazione in sprint brevi facilita il coordinamento tra i membri del gruppo e mantiene allineato l'avanzamento dei diversi documenti e artefatti sviluppati parallelamente.

3.2 Motivazioni

- **Adattabilità:** il piano di lavoro può essere revisionato sprint per sprint in base ai risultati e ai feedback ottenuti.
- **Visibilità continua:** le cerimonie strutturate garantiscono che tutto il team abbia sempre un quadro aggiornato dello stato di avanzamento.
- **Qualità incrementale:** la Definition of Done (Sez. 4) e le code review sistematiche riducono il rischio di accumulare debito tecnico.
- **Sviluppo competenze trasversali:** la rotazione settimanale dei ruoli garantisce che ogni membro acquisisca esperienza su tutti gli aspetti del progetto.

3.3 Cerimonie e cadenza settimanale

Ogni sprint ha durata di una settimana (martedì → martedì). La riunione principale si tiene il **martedì alle 14:30** e segue un ordine fisso:

1. **Sprint Retrospective** dello sprint precedente: cosa ha funzionato, cosa no, azioni correttive da applicare subito.
2. **Sprint Review** dello sprint precedente: verifica di ciò che è stato prodotto rispetto alla Definition of Done (Sez. 4), chiusura formale dei task.
3. **Sprint Planning:** aggiornamento del backlog prioritario, stima del tempo previsto, assegnazione dei task tramite Google Form. Output: Sprint Backlog della settimana.

Tabella 19: Schema cerimonie settimanali

Momento	Giorno/Ora	Tipo	Durata	Descrizione
Sprint Retrospective	Martedì, 14:30	Sincrono	~30 min	Riflessione interna del team per individuare punti di forza, criticità e possibili miglioramenti da applicare nello sprint successivo tramite azioni correttive.
Sprint Review	Martedì, 15:00	Sincrono	~20 min	Condivisione dei risultati ottenuti durante lo sprint, verifica di ciò che è stato prodotto rispetto alla Definition of Done e chiusura formale dello sprint precedente.
Sprint Planning	Martedì, 15:20	Sincrono	~2h	Definizione degli obiettivi dello sprint, aggiornamento del backlog, assegnazione dei task tramite Google Form e stima dei tempi previsti. Output: Sprint Backlog della settimana.
Allineamento mid-sprint	Venerdì	Sincrono	~30 min	Incontro intermedio per confrontarsi sull'avanzamento dei task dello sprint corrente, segnalare eventuali blocchi e coordinare eventuali aggiustamenti. Non sostituisce il Daily Stand-up asincrono.
Daily Stand-up	Ogni giorno, 10:30	Asincrono	~2 min/persona	Ogni membro aggiorna il canale con: (1) cosa ho fatto, (2) cosa farò, (3) blocchi o dubbi. Non obbligatorio nei giorni in cui è prevista una riunione sincrona.

3.4 Risorse Umane

Il team è composto da 6 membri, con ruoli rotativi secondo il modello Scrum. Ogni membro dedica in media dalle 10 alle 20 ore settimanali al progetto.

4 Definition of Done (DoD)

La Definition of Done è la lista di criteri che un task deve soddisfare per essere considerato completato. Si applica a due livelli distinti e si espande al crescere del progetto: la Sez. 4.1 è attiva fin dal primo sprint, mentre, la Sez. 4.2 dall'inizio dello sviluppo del PoC.

4.1 Livello task: Fase documentale

Attiva da: Sprint 1.

Applicabile a: tutti i task documentali.

Creazione e tracciabilità

- Il task è stato creato tramite Google Form dal Responsabile durante la riunione del martedì.
- Il task è linkato nel verbale della riunione dal Redattore.
- È stato creato un branch da **development** direttamente dalla issue, con naming:
`<id>-<gestionale|tecnico>-<esterno|interno>-<nomeDoc>`
- Il branch è stato pushato entro la fine del giorno in cui si inizia a lavorare (anche se il documento è vuoto), così la issue risulta *In Progress* nel board.

Redazione

- Il documento rispetta il template e la struttura concordata nelle Norme di Progetto.
- Il contenuto è completo rispetto allo scope definito nel task.
- Nessun segnaposto [da compilare] lasciato senza motivazione esplicita.
- Ortografia e grammatica verificate.
- Terminologia coerente con il Glossario di progetto.

Commit e Pull Request

- Ogni commit fa riferimento alla issue con **#id** nel messaggio.
- I messaggi di commit sono concisi e fanno riferimento al documento di riunione se pertinente.
- La PR è aperta **entro domenica** per dare tempo al Verificatore di revisionare prima del martedì successivo.
- La PR linka la issue corrispondente.

Revisione

- Il Verificatore assegnato ha revisionato il documento.
- Tutti i commenti della review sono stati risolti o discussi prima del merge.
- È il Redattore a fare il merge, non il Verificatore.

Chiusura

- Merge effettuato su **main**.
- Issue chiusa nel board.
- Ore effettive aggiornate su Google Form.

4.2 Livello task: Fase sviluppo (PoC)

Attiva da: Sprint (da definire).

Applicabile a: tutti i task di sviluppo software.

[Da compilare] *Questa sezione verrà completata quando il team avvierà lo sviluppo del Proof of Concept. I criteri includeranno almeno:*

- codice funzionante in locale senza errori;
- test unitari e/o di integrazione scritti e superati;
- copertura dei test non inferiore alla soglia concordata (es. $\geq 70\%$);
- nessun bug bloccante aperto;
- linting superato secondo la configurazione del repository;
- PR revisionata e approvata da almeno un membro del team;
- documentazione tecnica (commenti, Swagger/JSDoc) aggiornata;
- task chiuso nel board e ore rendicontate.

I criteri definitivi verranno concordati dal team prima dell'avvio dello sprint di sviluppo e aggiunti qui.

4.3 Livello sprint

Uno sprint è **Done** se:

- tutti i task pianificati sono Done (Livello task), oppure esplicitamente rimandati al backlog con motivazione scritta nel verbale;
- il verbale della riunione del martedì è redatto e approvato;
- il registro dei rischi è stato rivalutato nella Sprint Review;
- la Retrospettiva ha prodotto almeno un'azione correttiva concreta per il prossimo sprint;
- le ore effettive di tutti i membri sono rendicontate su Google Form.

5 Pianificazione

5.1 Suddivisione temporale

La pianificazione del progetto è articolata nelle seguenti fasi principali:

- **Candidatura e assegnazione dell'appalto:** Marzo 2026;
- **Fase RTB (Requirements and Technology Baseline):** Marzo 2026 – Giugno 2026;
- **Fase PB (Product Baseline):** Giugno 2026 – Agosto 2026.

5.2 Pianificazione a lungo termine

5.2.1 Attività di candidatura (CC)

Prima dell'avvio formale degli sprint RTB il team ha svolto le seguenti attività preparatorie (Marzo 2026):

- Primo allineamento su struttura documenti, Norme di Progetto (2026/03/13 – in corso) e Glossario (2026/03/13 – in corso).
- Stima dell'impegno orario complessivo e definizione del budget di progetto presentati nel Preventivo dei Costi e Assunzione degli Impegni (2026/03/13 – 2026/03/26).
- Analisi e valutazione della fattibilità dei capitolati proposti con analisi comparativa dei capitolati proposti, motivazione della scelta del capitolato C6 (Zucchetti: *Second Brain*) presentati nella Valutazione dei Capitolati (2026/03/17 – 2026/03/26).
- Stesura e presentazione formale della candidatura tramite Lettera di Presentazione (2026/03/27).
- Configurazione del repository documentale e del sito di presentazione della documentazione ufficiale.

5.2.2 Attività preparatorie alla RTB

A seguito dell'aggiudicazione del capitolato, prima dell'avvio formale degli sprint RTB, il gruppo ha svolto (Marzo – Aprile 2026):

- Definizione dell'assetto Scrum: ruoli, strumenti, convenzioni di naming, flusso GitHub.
- Configurazione del board GitHub Project e del Google Form di creazione automatizzata di Issues con relativo foglio Google Fogli per il tracciamento.

5.2.3 Attività fissate per la RTB

La fase RTB copre il periodo Aprile – Giugno 2026. Di seguito è riportato lo stato di avanzamento di ciascun documento/attività al momento dell'ultimo aggiornamento del presente documento.

5.2.3.1 Norme di Progetto (NdP) Parti previste: introduzione, processi primari, di supporto e organizzativi, metriche di qualità, convenzioni redazionali e di configurazione.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/03/13.

Stato attuale: in aggiornamento continuo.

5.2.3.2 Glossario Parti previste: termini tecnici e di progetto, aggiornati incrementalmente.
Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/03/13.

Stato attuale: in aggiornamento continuo.

5.2.3.3 Piano di Progetto (PdP) Parti previste: introduzione, analisi dei rischi, modello di sviluppo, Definition of Done, pianificazione, preventivo, consuntivi per sprint, preventivo a finire, organigramma.

Sprint di redazione: tutti gli sprint RTB.

Data prima stesura: 2026/04/09.

Stato attuale: in aggiornamento continuo.

5.2.3.4 Analisi dei Requisiti (AdR) Parti previste: introduzione, casi d'uso, requisiti funzionali e non funzionali, tracciamento (requisiti-fonte, UC-requisiti, fonti-requisiti), riepilogo.

Sprint di redazione: Sprint 1 – Sprint 7

Data prima stesura: 2026/04/08.

Stato attuale: completata per RTB; in attesa di validazione con il proponente.

5.2.3.5 Piano di Qualifica (PdQ) Parti previste: introduzione, metriche di qualità di processo, cruscotto di valutazione, resoconto e miglioramento.

Sprint di redazione: Sprint 3 – Sprint N (da definire).

Data prima stesura: 2026/05/11.

Stato attuale: in corso.

5.2.3.6 Stato dell'Arte – Analisi Tecnologica Parti previste: analisi delle tecnologie candidate per il sistema *Second Brain*, valutazione comparativa, scelte motivate.

Sprint di redazione: Sprint 6.

Data prima stesura: 2026/05/13.

Stato attuale: completato; in attesa di confronto con il proponente.

5.2.3.7 Proof of Concept (PoC) Artefatto eseguibile per la validazione tecnologica (Technology Baseline).

Sprint di sviluppo: Sprint N (da definire) – Sprint N (da definire).


Stato attuale: non ancora avviato.

5.2.4 Diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt mostra la dislocazione temporale delle attività del progetto, le loro dipendenze e il parallelismo tra documenti sviluppati in modo incrementale.

Le dipendenze seguono il modello output-input: un'attività può iniziare solo quando le attività da cui dipende hanno prodotto un output sufficiente.

La struttura delle attività principali è la seguente:

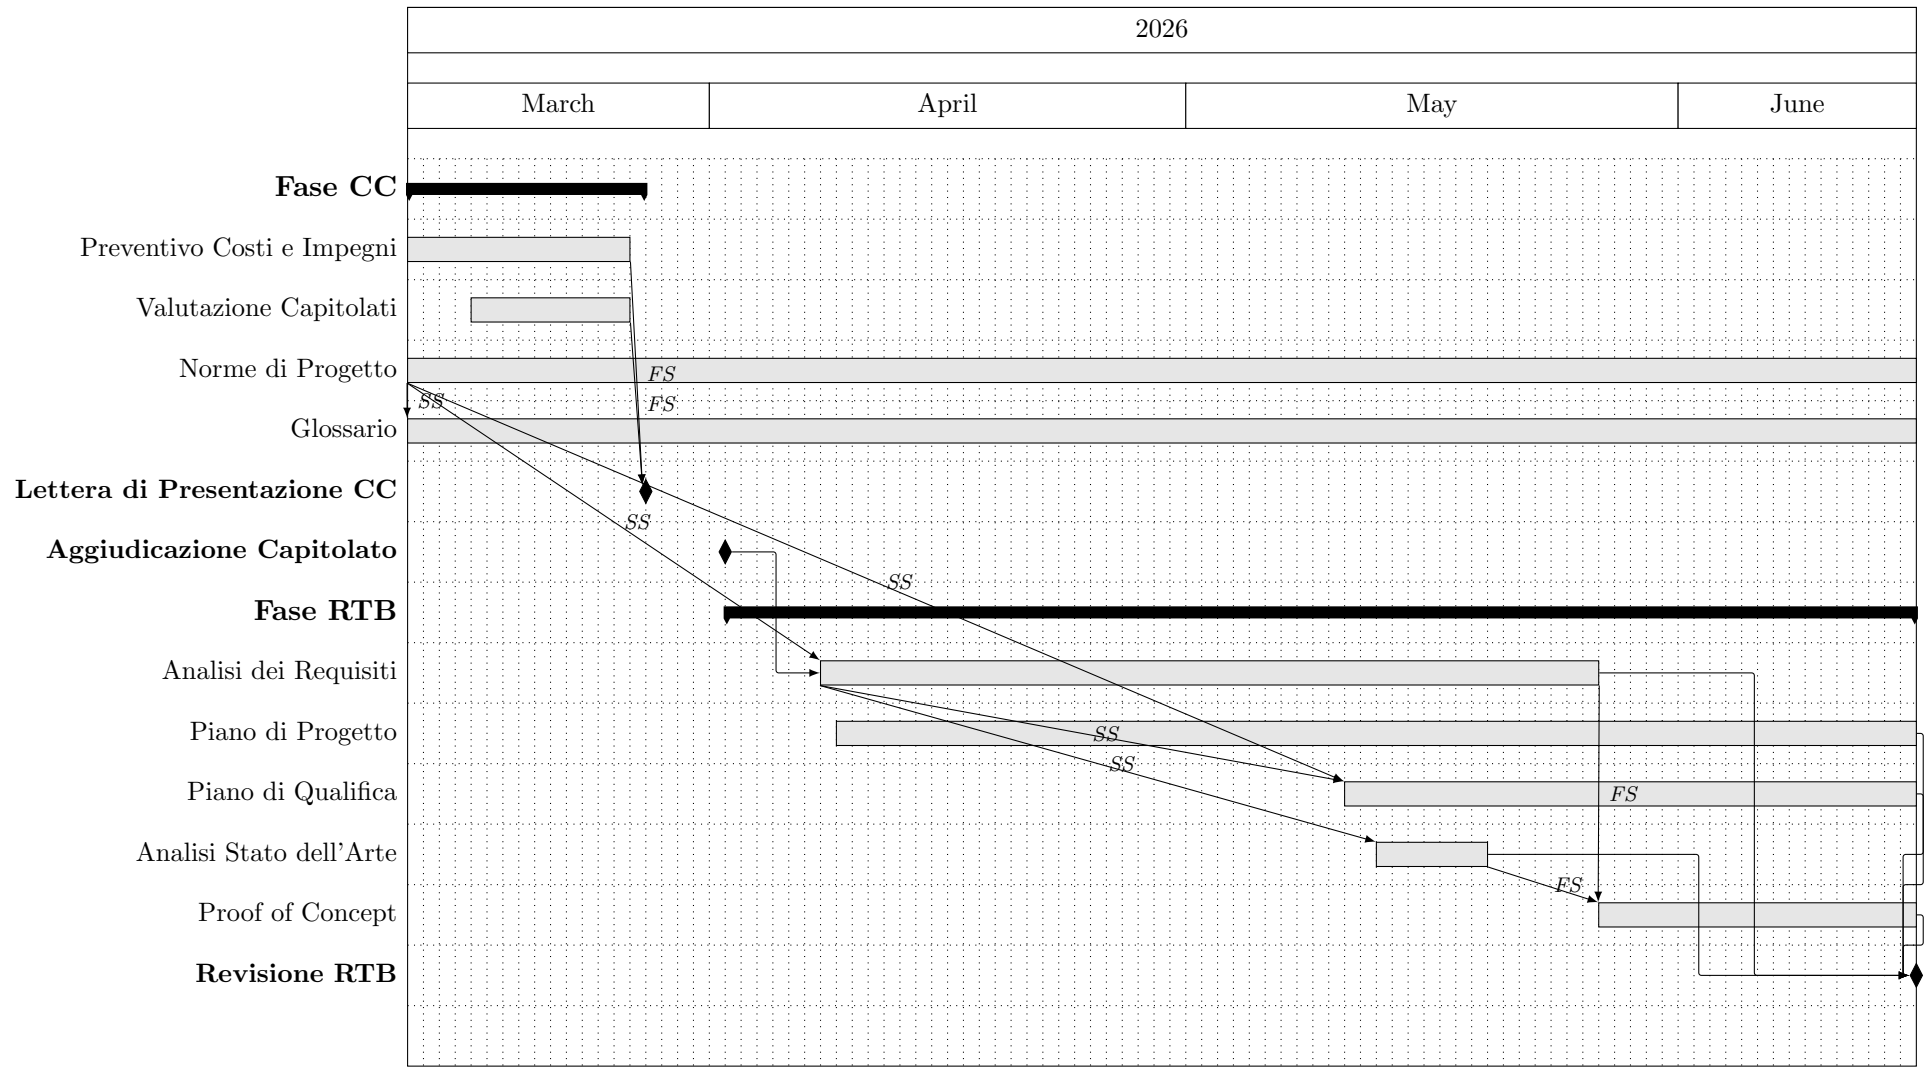

6 Preventivo

6.1 Assunzioni sul costo orario per ruolo

Il calcolo dei costi si basa sulle tariffe orarie imposte dal regolamento didattico:

- **Responsabile:** 30 €/h
- **Amministratore:** 20 €/h
- **Analista:** 25 €/h
- **Progettista:** 25 €/h
- **Programmatore:** 15 €/h
- **Verificatore:** 15 €/h

6.2 Preventivo iniziale

Ruolo	Ore Totali	Costo Orario	Costo Totale (€)
Responsabile	55	30 €	1.650,00 €
Amministratore	48	20 €	960,00 €
Analista	125	25 €	3.125,00 €
Progettista	125	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91	15 €	1.365,00 €
Verificatore	96	15 €	1.440,00 €
Costo Totale Preventivato	540		11.665,00 €

6.3 Ore di ciascun componente per ruolo preventivate

Di seguito viene illustrata la suddivisione esatta delle ore per ruolo per ogni componente del team. La distribuzione è stata bilanciata per assicurare che ciascun membro raggiunga esattamente le 90 ore previste dal preventivo.

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	9	8	21	20	16	16	90
Roberto Mariano Doroftei	9	8	21	20	16	16	90
Filippo Idiometri	9	8	21	20	15	17	90
Francesco Marcon	10	8	21	22	14	15	90
Armando Moda Scarati	9	8	21	21	15	16	90
Anton Ricardo Rupi	9	8	20	22	15	16	90
Totale	55	48	125	125	91	96	540

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

7 Sprint

7.1 Sprint 1 – 07/04/2026 – 13/04/2026

7.1.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Responsabile
- Francesco Marcon: Amministratore
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupì: Analista
- Filippo Idiometri: Verificatore

7.1.2 Obiettivi

- Avviare la redazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Avviare la redazione del Piano di Progetto (PdP).
- Studio dei casi d'uso e definizione delle convenzioni.

7.1.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	RE	1,6	48,00 €
Francesco Marcon	AM	1,25	25,00 €
Roberto M. Doroftei	AN	1,5	37,50 €
Armando M. Scarati	AN	1,5	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	AN	2	50,00 €
Filippo Idiometri	VE	1,5	22,50 €
Totale		9,35	220,50 €

Tabella 20: Tabella Preventivo Sprint 1

7.1.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.

7.1.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	RE	1,6	1,6	(-0,0)	48,00 €	(0,00 €)
Francesco Marcon	AM	1,25	1,25	(-0,0)	25,00 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	AN	1,5	2	(+0,5)	50,00 €	(+12,50 €)
Armando M. Scarati	AN	1,5	3	(+1,5)	75,00 €	(+37,50 €)
Anton Ricardo Ruppi	AN	2	3	(+1,0)	75,00 €	(+25,00 €)
Filippo Idiometri	VE	1,5	1,6	(+0,1)	24,00 €	(+1,50 €)
Totale		9,35	12,45	(+3,1)	297,00 €	(+76,50 €)

Tabella 21: Tabella Consuntivo Sprint 1

7.1.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	53,4	30 €	1.602,00 €
Amministratore	46,75	20 €	935,00 €
Analista	117	25 €	2.925,00 €
Progettista	125	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91	15 €	1.365,00 €
Verificatore	94,4	15 €	1.416,00 €
Totale Residuo	527,55		11.368,00 €

Tabella 22: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 1

7.1.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,4	8	21	20	16	16	88,4
Roberto Mariano Doroftei	9	8	19	20	16	16	88
Filippo Idiometri	9	8	21	20	15	15,4	88,4
Francesco Marcon	10	6,75	21	22	14	15	88,75
Armando Moda Scarati	9	8	18	21	15	16	87
Anton Ricardo Ruppi	9	8	17	22	15	16	87
Totale	53,4	46,75	117	125	91	94,4	527,55

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 23: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 1

7.1.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **#id nei commit:** ogni commit deve riportare l'id della issue (es. `#12 fix struttura sezione requisiti`).
- **Descrizioni commit concise:** il messaggio deve essere breve e fare riferimento al documento di riunione pertinente, non descrivere ogni singola modifica.
- **PR entro domenica:** la Pull Request deve essere aperta entro la domenica dello sprint, per garantire al Verificatore il tempo necessario prima del martedì.
- **Ore effettive in tabella:** ogni membro deve aggiornare le ore effettive su Google Form prima della riunione del martedì successivo.

7.1.9 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il team ha introdotto alcune misure correttive che incidono direttamente sul monitoraggio e sulla mitigazione di diversi rischi individuati nel registro dei rischi. In particolare, la standardizzazione dei commit (inclusione obbligatoria dell'ID della issue e messaggi sintetici) e l'apertura anticipata delle Pull Request migliorano la tracciabilità delle modifiche e l'efficacia delle code review, contribuendo alla mitigazione dei rischi **RR1** (ambiguità nei requisiti), **RR3** (qualità del prodotto) e **RT1** (inesperienza tecnica).

L'obbligo di aggiornare puntualmente le ore effettive prima della Sprint Review consente inoltre un controllo più accurato dell'avanzamento, riducendo la probabilità di ritardi nelle milestone (**RR4**) e migliorando il bilanciamento del carico di lavoro tra i membri del team (**RO3**). Le misure introdotte sono state integrate nel processo di sviluppo e verranno monitorate negli sprint successivi per valutarne l'efficacia.

7.1.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione congiunta dell'Analisi dei Requisiti con presentazione da parte dei redattori.
- Revisione congiunta del Piano di Progetto con discussione sulla struttura.
- Definizione delle convenzioni per i casi d'uso.
- Allineamento sulla struttura dei documenti e sulle Norme di Progetto.

7.2 Sprint 2 – 14/04/2026 – 21/04/2026

7.2.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore

- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Analista

7.2.2 Obiettivi

- Aggiornamento della redazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Aggiornamento della redazione del Piano di Progetto (PdP).
- Redazione della mail da inviare al proponente Zucchetti S.p.A.

7.2.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	2	50,00 €
Francesco Marcon	AN	1,5	37,50 €
Roberto M. Doroftei	RE	1	30,00 €
Armando Moda Scarati	AM	0,2	4,00 €
Anton Ricardo Rupì	VE	1,3	19,50 €
Filippo Idiometri	AN	1,5	37,50 €
Totale		7.5	178,50 €

Tabella 24: Tabella Preventivo Sprint 2

7.2.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.
- RR1: Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.

7.2.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	2	5	(+3,0)	125,00 €	(+75,00 €)
Francesco Marcon	AN	1,5	1,5	(-0,0)	37,50 €	(0,00 €)
Roberto M. Doroftei	RE	1	1,3	(+0,3)	39,00 €	(9,00 €)
Armando M. Scarati	AM	0,2	0,2	(-0,0)	4,00 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupì	VE	1,3	1,8	(+0,5)	27,00 €	(+7,50 €)
Filippo Idiometri	AN	1,5	2	(+0,5)	50,00 €	(12,50 €)
Totale		7,5	11,8	(+4,3)	282,50 €	(+104,00 €)

Tabella 25: Tabella Consuntivo Sprint 2

7.2.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	52,1	30 €	1.563,00 €
Amministratore	46,5	20 €	930,00 €
Analista	108,5	25 €	2.712,50 €
Progettista	125	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91	15 €	1.365,00 €
Verificatore	92,6	15 €	1.389,00 €
Totale Residuo	515,7		11.084,50 €

Tabella 26: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 2

7.2.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,4	8	16	20	16	16	83,4
Roberto Mariano Doroftei	7,7	8	19	20	16	16	86,7
Filippo Idiometri	9	8	19	20	15	15,4	86,4
Francesco Marcon	10	6,7	19,5	22	14	15	87,2
Armando Moda Scarati	9	7,8	18	21	15	16	86,8
Anton Ricardo Ruppi	9	8	17	22	15	14,2	85,2
Totale	52,1	46,5	108,5	125	91	92,6	515,7

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 27: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 2

7.2.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Ordinamento Lucidspark:** gli use case presenti nel lucid spark devono essere ordinati dall'alto al basso per i nuovi casi e da sinistra a destra per i vari sottocasi, inoltre le varie macroaree sono separate da delle note che danno inoltre il colore ai vari use case appartenenti ad esse.
- **Descrizioni registro modifiche standard:** ogni descrizione presente nel registro delle modifiche deve essere conclusa con il "." e non lasciata senza segno di punteggiatura.
- **Nomenclatura UC:** ogni use case deve essere rappresentato nelle immagini come "UC X: testo".

7.2.9 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il team ha introdotto alcune misure correttive. In particolare, l'ordinamento standardizzato degli use case in Lucidspark riduce il rischio di incomprensioni e ambiguità e facilita la possibilità di modifica nel caso in cui ce ne sia bisogno. La standardizzazione della nomenclatura degli use case nelle immagini ("UC X: testo") migliora la leggibilità e la coerenza formale della documentazione.

7.2.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione congiunta dell'Analisi dei Requisiti con presentazione da parte dei redattori.
- Revisione congiunta del Piano di Progetto con discussione sulla struttura.

7.3 Sprint 3 – 21/04/2026 – 27/04/2026

7.3.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Amministratore
- Francesco Marcon: Responsabile
- Roberto Mariano Doroftei: Verificatore
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Ruppi: Analista
- Filippo Idiometri: Analista

7.3.2 Obiettivi

- Aggiornamento del sito con i documenti recenti.
- Procedere con la stesura dell'Analisi dei Requisiti (AdR), macroarea 3 e UC15, UC19.
- Procedere con la stesura del Piano di Progetto (PdP), sprint 2.
- Invio email per richiesta ricevimento a prof. Cardin.
- Riordino del documento condiviso con i diagrammi dei Casi d'Uso.

7.3.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	1,83	36,67 €
Francesco Marcon	RE	1,5	45,00 €
Roberto M. Doroftei	VE	1,25	18,75 €
Armando Moda Scarati	AN	1,5	37,50 €
Anton Ricardo Ruppi	AN	1,5	37,50 €
Filippo Idiometri	AN	0,67	16,67 €
Totale		8,25	192,08 €

Tabella 28: Tabella Preventivo Sprint 3

7.3.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per malattia o impegni accademici.
- RR1: Requisiti ambigui o cambiamenti frequenti da parte del committente.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.

7.3.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	1,83	1,72	(-0,12)	34,33 €	(-2,33 €)
Francesco Marcon	RE	1,5	1,67	(+0,17)	50,00 €	(+5,00 €)
Roberto M. Doroftei	VE	1,25	2,08	(+0,83)	31,25 €	(+12,50 €)
Armando Moda Scarati	AN	1,5	1,5	(-0,0)	37,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Ruppi	AN	1,5	1,5	(-0,0)	37,50 €	(0,00 €)
Filippo Idiometri	AN	0,67	1	(+0,33)	25,00 €	(+8,33 €)
Totale		8,25	9,47	(+1,22)	215,58 €	(+23,50 €)

Tabella 29: Tabella Consuntivo Sprint 3

7.3.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo (€)
Responsabile	50,42	30 €	1.512,50 €
Amministratore	44,7	20 €	894,00 €
Analista	104,5	25 €	2.612,50 €
Progettista	125	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91	15 €	1.365,00 €
Verificatore	90,67	15 €	1.360,00 €
Totale Residuo	506,28		10.869,00 €

Tabella 30: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 3

7.3.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	6,28	16	20	16	16	81,62
Francesco Marcon	8,33	6,75	19,25	22	14	15	85,33
Roberto Mariano Doroftei	7,75	8	18,5	20	16	13,92	84,17
Armando Moda Scarati	9	7,67	17	21	15	16	85,67
Anton Ricardo Rupì	9	8	15,5	22	15	14,33	83,83
Filippo Idiometri	9	8	18,25	20	15	15,42	85,67
Totale	50,42	44,7	104,5	125	91	90,67	506,28

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 31: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 3

7.3.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Semplificare Calcolo Ore:** il gruppo ha ritenuto necessario semplificare il calcolo delle ore, in particolare la conversione da minuti a ore, utilizzando un foglio excel aggiuntivo, per facilitare, di conseguenza, la stesura del Piano di Progetto (PdP) ed evitare il più possibile errori di calcolo.
- **Gestire i Tempi Previsti:** nel foglio excel che funge da gestionale per le task definite, ogni task prevede un tempo aggiuntivo per il Responsabile, e l'Amministratore (tempi di gestione generale). Questi tempi, non hanno senso di esistere se la task è assegnata proprio a uno di questi due ruoli, quindi è necessario impostare a 0 i tempi previsti di responsabile e amministratore in caso la task fosse assegnataria di uno di questi due ruoli.

7.3.9 Aggiornamento dei rischi

A seguito della Sprint Retrospective, il gruppo ha deciso di introdurre un ulteriore foglio excel per tenere migliore traccia del calcolo delle ore previste, effettive, e rimanenti, sia per membro del gruppo, sia per ruolo.

7.3.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisionati i diagrammi dei casi d'uso, è necessario aggiornare il diagramma 12.6 per correzione refuso.
- Nel PdP è necessario aggiungere il rischio RO3 per rischio di sbilanciamento del carico di lavoro.
- Aggiornato il sito con i documenti più recenti.
- Stesura dell'Analisi dei Requisiti (AdR) revisionata e approvata.
- Stesura dello sprint 2 nel Piano di Progetto (PdP) revisionata e approvata.
- Fissato incontro da remoto con prof. Cardin.
- Riordinato documento condiviso LucidSpark con i diagrammi dei casi d'Uso.

7.4 Sprint 4 – 28/04/2026 – 04/05/2026

7.4.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Verificatore
- Francesco Marcon: Analista
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Anton Ricardo Rupl: Amministratore
- Filippo Idiometri: Responsabile

7.4.2 Obiettivi

- Revisione e verifica dei documenti in lavorazione (AdR, DdB).
- Aggiornamento del Piano di Progetto.
- Revisione degli strumenti di tracciamento ore e calcolo consuntivo.

7.4.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	VE	1,08	16,25 €
Francesco Marcon	AN	1,33	33,33 €
Roberto M. Doroftei	AN	1,50	37,50 €
Armando Moda Scarati	AN	1,50	37,50 €
Anton Ricardo Ruppi	AM	1,17	23,33 €
Filippo Idiometri	RE	1,00	30,00 €
Totale		7,58	177,92 €

Tabella 32: Tabella Preventivo Sprint 4

7.4.4 Rischi Previsti

Il gruppo non prevede rischi particolari per questo sprint oltre a quelli ordinari già monitorati.

7.4.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	VE	1,08	1,58	(+0,50)	23,75 €	(+7,50 €)
Francesco Marcon	AN	1,33	1,50	(+0,17)	37,50 €	(+4,17 €)
Roberto M. Doroftei	AN	1,50	1,83	(+0,33)	45,83 €	(+8,33 €)
Armando Moda Scarati	AN	1,50	1,83	(+0,33)	45,83 €	(+8,33 €)
Anton Ricardo Ruppi	AM	1,17	0,50	(-0,67)	10,00 €	(-13,33 €)
Filippo Idiometri	RE	1,00	1,00	(-0,00)	30,00 €	(0,00 €)
Totale		7,58	8,25	(+0,67)	192,92 €	(+15,00 €)

Tabella 33: Tabella Consuntivo Sprint 4

7.4.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	49,42	30 €	1.482,50 €
Amministratore	44,20	20 €	884,00 €
Analista	99,33	25 €	2.483,33 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	89,08	15 €	1.336,25 €
Totale Residuo	498,03		10.676,08 €

Tabella 34: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 4

7.4.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	6,28	16,00	20,00	16,00	14,42	80,03
Francesco Marcon	8,33	6,75	17,75	22,00	14,00	15,00	83,83
Roberto M. Doroftei	7,75	8,00	16,67	20,00	16,00	13,92	82,33
Armando Moda Scarati	9,00	7,67	15,17	21,00	15,00	16,00	83,83
Anton Ricardo Rupì	9,00	7,50	15,50	22,00	15,00	14,33	83,33
Filippo Idiometri	8,00	8,00	18,25	20,00	15,00	15,42	84,67
Totale	49,42	44,20	99,33	125,00	91,00	89,08	498,03

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 35: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 4

7.4.8 Sprint Retrospective

Lo sprint si è svolto regolarmente senza criticità rilevanti. Non emergono azioni correttive per il prossimo sprint.

7.4.9 Aggiornamento dei rischi

Non si segnalano nuovi rischi emersi durante lo sprint. I rischi già monitorati rimangono invariati nel loro profilo di probabilità e impatto. Le misure di contingenza in corso continuano ad essere applicate regolarmente.

7.4.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- Revisione e spiegazione degli strumenti Excel di tracciamento e calcolo ore, con illustrazione del flusso di utilizzo per il calcolo semplificato del consuntivo di sprint.

- Diario di Bordo (DdB) revisionato e approvato.
- Macroarea 1 dell'Analisi dei Requisiti (AdR) revisionata e approvata.

7.5 Sprint 5 – 05/05/2026 – 11/05/2026

7.5.1 Ruoli assegnati

- Anton Ricardo Rupì: Responsabile
- Sofia De Blasi: Amministratore
- Filippo Idiometri: Analista (tecnologie)
- Roberto Mariano Doroftei: Analista
- Armando Moda Scarati: Analista
- Francesco Marcon: Verificatore

7.5.2 Obiettivi

- **Piano di Qualifica (PdQ):** Individuare la struttura iniziale e i contenuti del documento.
- **Studio Tecnologie:** Individuare le tecnologie possibili per frontend e backend, valutazione pro e contro.
- **Norme di Progetto (NdP):** Aggiornamento e incremento del documento.
- **Analisi dei Requisiti (AdR):** Aggiornamento macroaree 2 e 3 secondo le nuove indicazioni e migliorare l'introduzione.
- **Gestione e Documentazione:** Stesura del verbale interno, stesura del Piano di Progetto (PdP) per lo Sprint 4 e preparazione del Diario di Bordo.

7.5.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AM	3,08	61,67 €
Francesco Marcon	VE	2,50	37,50 €
Roberto M. Doroftei	AN	1,50	37,50 €
Armando Moda Scarati	AN	1,50	37,50 €
Anton Ricardo Rupì	RE	2,00	60,00 €
Filippo Idiometri	AN	1,50	37,50 €
Totale		12,08	271,67 €

Tabella 36: Tabella Preventivo Sprint 5

7.5.4 Rischi Previsti

- **RO5 / RR1 (Ambiguità della Visione / Requisiti):** Rischio di difficoltà e ambiguità nella modellazione granulare dei casi d'uso (AdR) e nell'associazione dei vari documenti ai rispettivi ruoli (in particolare per il PdQ).

7.5.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AM	3,08	4,42	(+1,33)	88,33 €	(+26,67 €)
Francesco Marcon	VE	2,50	1,00	(-1,50)	15,00 €	(-22,50 €)
Roberto M. Doroftei	AN	1,50	1,50	(-0,00)	37,50 €	(0,00 €)
Armando Moda Scarati	AN	1,50	1,50	(-0,00)	37,50 €	(0,00 €)
Anton Ricardo Rupi	RE	2,00	1,33	(-0,67)	40,00 €	(-20,00 €)
Filippo Idiometri	AN	1,50	1,00	(-0,50)	25,00 €	(-12,50 €)
Totale		12,08	10,75	(-1,33)	243,33 €	(-28,33 €)

Tabella 37: Tabella Consuntivo Sprint 5

7.5.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	48,08	30 €	1.442,50 €
Amministratore	39,78	20 €	795,67 €
Analista	95,33	25 €	2.483,33 €
Progettista	125,00	25 €	3.125,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	88,08	15 €	1.321,25 €
Totale Residuo	487,28		10.432,75 €

Tabella 38: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 5

7.5.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	1,87	16,00	20,00	16,00	14,42	75,62
Francesco Marcon	8,33	6,75	17,75	22,00	14,00	14,00	82,83
Roberto M. Doroftei	7,75	8,00	15,17	20,00	16,00	13,92	80,83
Armando Moda Scarati	9,00	7,67	13,67	21,00	15,00	16,00	82,33
Anton Ricardo Rupi	7,67	7,50	15,50	22,00	15,00	14,33	82,00
Filippo Idiometri	8,00	8,00	17,25	20,00	15,00	15,42	83,67
Totale	48,08	39,78	95,33	125,00	91,00	88,08	487,28

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 39: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 5

7.5.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Gestione carico Amministratore:** Avendo riscontrato una chiara e sistematica sotto-stima delle ore dell'Amministratore per via del carico legato alla stesura materiale dei testi dei documenti (PdP, NdP, PdQ), viene stabilito di tracciare formalmente la problematica nel Diario di Bordo e di ridefinire preventivamente la ripartizione oraria nei prossimi sprint per compensare lo sforzo redazionale.
- **Pianificazione Piano di Qualifica:** Durante lo Sprint 5 la redazione dei contenuti del PdQ è stata inizialmente posticipata per via di alcune incertezze sul perimetro del documento. La criticità è stata superata discutendo e definendo insieme la struttura logica principale durante la riunione del 12 maggio, sbloccando così il lavoro per la stesura effettiva nel ciclo successivo.

7.5.9 Aggiornamento dei rischi

Durante lo sprint si sono manifestate incertezze sulla struttura iniziale del PdQ e sulla granularità dei casi d'uso dell'AdR, riconducibili al rischio **RO5** (Scarsa comprensione dei requisiti o della visione di progetto). Questa criticità è stata gestita e superata attraverso il confronto collettivo del team durante la riunione dopo una riunione con il Professore Cardin. Per tutti gli altri rischi presenti nel registro, compresi i rischi tecnici, non si registrano variazioni rispetto al loro profilo precedente.

7.5.10 Sprint Review

- **Piano di Qualifica:** Approvata la struttura principale del documento.
- **Scelte Tecnologiche:** Completata la panoramica comparativa per il frontend (React vs Vue) e per il backend (valutando l'opzione custom in Python rispetto ad architetture serverless con AWS Lambda).
- **Analisi dei Requisiti:** Apportate modifiche correttive strutturali (rimozione definitiva dell'entità chatbot, sfoltimento e rimodellazione del tracciamento dei Sei Cappelli).
- **Approvazione Consuntivo:** Validato lo spostamento di ore effettive a favore dell'Amministratore, compensato dal minor tempo richiesto per le attività di verifica e analisi tecnica. Viene fissato il traguardo strategico di completare AdR e Stato dell'Arte entro due sprint per procedere con il PoC.

7.6 Sprint 6 – 12/05/2026 – 18/05/2026

7.6.1 Ruoli assegnati

- Sofia De Blasi: Analista
- Francesco Marcon: Progettista
- Roberto Mariano Doroftei: Responsabile
- Armando Moda Scarati: Amministratore

- Anton Ricardo Rupì: Verificatore
- Filippo Idiometri: Analista

7.6.2 Obiettivi

- Completamento e approvazione dell'Analisi dei Requisiti (AdR).
- Avanzamento del Piano di Qualifica (PdQ): revisione metriche, cruscotto di valutazione e azioni correttive.
- Completamento dello Stato dell'Arte sulle tecnologie candidate.
- Aggiornamento del Piano di Progetto (PdP).

7.6.3 Preventivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Costo prev.
Sofia De Blasi	AN	2,50	62,50 €
Francesco Marcon	PJ	1,50	37,50 €
Roberto M. Doroftei	RE	2,00	60,00 €
Armando Moda Scarati	AM	2,67	53,33 €
Anton Ricardo Rupì	VE	1,83	27,50 €
Filippo Idiometri	AN	2,50	62,50 €
Totale		13,00	303,33 €

Tabella 40: Tabella Preventivo Sprint 6

7.6.4 Rischi Previsti

Il gruppo pensa sia possibile che possano presentarsi i seguenti rischi:

- RO1: Membro del team non disponibile per impegni accademici.
- RO3: Distribuzione sbilanciata del carico di lavoro.
- RR1: Requisiti ambigui da chiarire con il committente.

7.6.5 Consuntivo

Membro	Ruolo	Ore prev.	Ore eff.	Δ ore	Costo eff.	Δ costo
Sofia De Blasi	AN	2,50	10,00	(+7,50)	250,00 €	(+187,50 €)
Francesco Marcon	PJ	1,50	3,00	(+1,50)	75,00 €	(+37,50 €)
Roberto M. Dorof-tei	RE	2,00	1,92	(-0,08)	57,50 €	(-2,50 €)
Armando Moda Scarati	AM	2,67	2,75	(+0,08)	55,00 €	(+1,67 €)
Anton Ricardo Rupi	VE	1,83	5,00	(+3,17)	75,00 €	(+47,50 €)
Filippo Idiometri	AN	2,50	4,50	(+2,00)	112,50 €	(+50,00 €)
Totale		13,00	27,17	(+14,17)	625,00 €	(+321,67 €)

Tabella 41: Tabella Consuntivo Sprint 6

7.6.6 Prospetto risorse residue per ruolo

Ruolo	Ore Residue	Costo Orario	Costo Totale Residuo
Responsabile	46,17	30 €	1.385,00 €
Amministratore	37,03	20 €	740,67 €
Analista	80,83	25 €	2.020,83 €
Progettista	122,00	25 €	3.050,00 €
Programmatore	91,00	15 €	1.365,00 €
Verificatore	83,08	15 €	1.246,25 €
Totale Residuo	460,12		9.807,75 €

Tabella 42: Tabella Risorse Residue per Ruolo dopo Sprint 6

7.6.7 Prospetto ore residue per membro

Membro	Re	Am	An	Pj	Pr	Ve	Totale
Sofia De Blasi	7,33	1,87	6,00	20,00	16,00	14,42	65,62
Francesco Marcon	8,33	6,75	17,75	19,00	14,00	14,00	79,83
Roberto M. Doroftei	5,83	8,00	15,17	20,00	16,00	13,92	78,92
Armando Moda Scarati	9,00	4,92	13,67	21,00	15,00	16,00	79,58
Anton Ricardo Rupi	7,67	7,50	15,50	22,00	15,00	9,33	77,00
Filippo Idiometri	8,00	8,00	12,75	20,00	15,00	15,42	79,17
Totale	46,17	37,03	80,83	122,00	91,00	83,08	460,12

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 43: Tabella Risorse Residue per Membro dopo Sprint 6

7.6.8 Sprint Retrospective

Azioni correttive emerse:

- **Allineamento trasversale:** tutti i membri devono mantenersi aggiornati sull'avanzamento complessivo del progetto, non solo sulle proprie task. È responsabilità di ciascuno seguire anche le attività degli altri tramite il board e il daily asincrono, così da rilevare dipendenze e blocchi in anticipo.

7.6.9 Aggiornamento dei rischi

Lo scostamento significativo tra ore preventivate ed effettive, in particolare per il ruolo di Analista (RO3), ha evidenziato la necessità di stime più accurate nella fase di planning e di un monitoraggio più frequente dell'avanzamento. Il rischio RR1 si è parzialmente manifestato: l'Analisi dei Requisiti ha richiesto revisioni più profonde del previsto, confermando la necessità di un confronto diretto con il proponente per validare la completezza dei requisiti e le tecnologie scelte prima della RTB.

7.6.10 Sprint Review

Attività svolte e output prodotti:

- **Analisi dei Requisiti (AdR):** documento completato per la RTB. Tutti i membri devono prenderne visione integrale prima del prossimo sprint. Azioni aperte:
 - Contattare il proponente per confrontarsi sulla completezza dei requisiti e sulle tecnologie scelte.
 - UC1: creazione della nota e UC2: eliminazione della nota vanno spostate nella macroarea 3 relativa allo spazio remoto; infatti, le funzionalità, in quanto non sussistenti in configurazione locale, appartengono alla macroarea opzionale "spazio remoto".
- **Piano di Qualifica (PdQ):** avanzamento con le seguenti azioni aperte per il prossimo sprint:

- Verificare la completezza delle azioni correttive documentate.
- Identificare le metriche richieste nel cruscotto RTB, distinguere quelle già disponibili (da modellare graficamente) da quelle mancanti (da ricavare definendo le modalità di misurazione).
- **Stato dell'Arte:** documento completato. Da confrontare con il referente del proponente per validare le tecnologie selezionate.

8 Preventivo a Finire (PaF)

Il Preventivo a Finire viene aggiornato al termine di ogni sprint sulla base degli scostamenti rilevati nel consuntivo. Riflette la stima aggiornata del costo totale del progetto tenendo conto di quanto già speso e di quanto rimane da fare.

8.1 Analisi scostamenti

Si evidenzia uno scostamento nelle ore associate al ruolo di Amministratore. Infatti, nella fase di preventivazione iniziale il carico documentale relativo alla redazione e manutenzione di documenti trasversali quali Piano di Progetto, Piano di Qualifica e Norme di Progetto è stato sottostimato.

L'avanzamento della fase RTB ha evidenziato la necessità di un maggiore impegno continuativo per attività di coordinamento, aggiornamento documentale e gestione organizzativa.

8.2 Ripianificazione

Da compilare se necessario: descrivere le azioni di ribilanciamento adottate (riduzione scope, redistribuzione ore, posticipo task).

8.3 Quadro economico aggiornato

Voce	Importo
Budget iniziale preventivato	11.665,00 €
Costo sostenuto finora	1.231,33 €
Costo stimato per completare	10.432,75 €
Nuovo totale stimato	11.664,08 €

9 Organigramma e Assegnazione Ruoli

9.1 Rotazione dei Ruoli

I ruoli ruotano ogni sprint. I ruoli coperti sono: Responsabile (RE), Amministratore (AM), Analista (AN), Progettista (PJ), Programmatore (PR), Verificatore (VE).

Tabella 44: Tabella Rotazione dei Ruoli

Sprint	Periodo		RE	AM	AN	PJ	PR	VE
S1	07/04 – 14/04		Sofia D.B.	Francesco M.	Roberto D. Armando M. Anton R.	–	–	Filippo I.
S2	14/04 – 21/04		Roberto D.	Armando M.	Sofia D.B. Francesco M. Filippo I.	–	–	Anton R.
S3	21/04 – 28/04		Francesco M.	Sofia D.B.	Filippo I. Armando M. Anton R.	–	–	Roberto D.
S4	28/04 – 05/05		Filippo I.	Anton R.	Francesco M. Roberto D. Armando M.	–	–	Sofia D.B.
S5	05/05 – 12/05		Anton R. Rupi	Sofia D.B.	Filippo I. Roberto M.D. Armando M.S.	–	–	Francesco M.
S6	12/05 – 19/05		Roberto D.	Armando M.	Sofia D.B. Filippo I.	Francesco M.	–	Anton R.
S7	19/05 – 26/05							
S8	26/05 – 02/06							
S9	02/06 – 09/06							

Continua nella pagina successiva

Sprint	Periodo	RE	AM	AN	PJ	PR	VE
S10	09/06 – 16/06						
S11	16/06 – 23/06						
S12	23/06 – 30/06						
S13	30/06 – 07/07						
S14	07/07 – 14/07						
S15	14/07 – 21/07						
S16	21/07 – 28/07						
S17	28/07 – 04/08						
S18	04/08 – 11/08						
S19	11/08 – 18/08						
S20	18/08 – 25/08						
S21	25/08 – 02/09						

9.2 Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)

La tabella traccia le ore totali assegnate a ciascun membro per ciascun ruolo durante l'intero progetto. L'obiettivo è mantenere l'equilibrio stabilito nel preventivo generale. Viene aggiornata al termine di ogni sprint.

Membro	RE	AM	AN	PJ	PR	VE	Totale
Sofia De Blasi	1,60	6,14	15,00	0	0	1,58	24,32
Francesco Marcon	1,67	1,25	3,00	3,00	0	1,00	9,92
Roberto M. Doroftei	3,22	0	5,33	0	0	2,08	10,63
Armando Moda Scarati	0	3,45	7,83	0	0	0	11,28
Anton Ricardo Ruppi	1,33	0,50	4,50	0	0	6,80	13,13
Filippo Idiometri	1,00	0	8,50	0	0	1,60	11,10
Totale	8,82	11,34	44,16	3,00	0	13,06	80,38

Legenda: RE=Responsabile, AM=Amministratore, AN=Analista, PJ=Progettista, PR=Programmatore, VE=Verificatore.

Tabella 45: Tabella Distribuzione ore per ruolo e persona (cumulativa)
